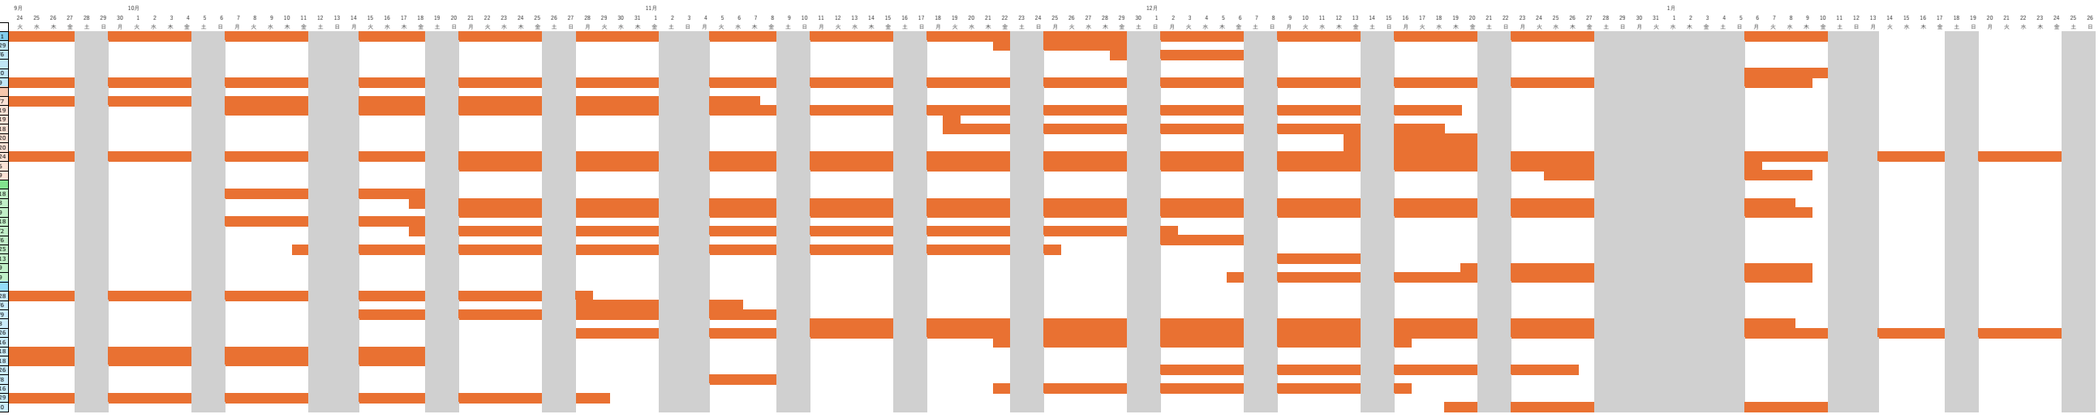親タスク	チタスク	担当者	開始日	終了日
全体			2024/9/24	2025/1/11
機能試	イスの回転上持ち上げ	全員	2024/11/22	2024/11/29
機能試	イスの転送と設置	全員	2024/11/29	2024/12/6
機能試	イスの回転と回収	全員	なし	なし
全体統合試験		全員	2025/1/6	2025/1/10
発表会	パワーポイント作成	見介	2024/9/24	2025/1/9
メカ				
ジャッキ	設計	志摩	2024/9/24	2024/11/7
	加工・製作	志摩	2024/10/7	2024/12/19
	単体試験	志摩	2024/11/19	2024/11/19
ボックス	設計	寺博	2024/11/19	2024/12/18
	加工・製作	寺博	2024/12/13	2024/12/20
	単体試験	寺博	2024/12/13	2024/12/20
全体	設計	二人	2024/9/24	2025/12/24
	加工・製作	二人	2024/10/20	2025/1/6
	統合試験	二人	2024/12/25	2025/1/9
エレキ				
電圧監	回路設計	穂	2024/10/7	2024/10/18
	回路実装	穂	2024/10/18	2025/1/8
	単体実験	穂	2024/10/19	2025/1/9
電源線	回路設計	柚斗	2024/10/7	2024/10/18
	回路実装	柚斗	2024/10/18	2024/12/2
	単体実験	柚斗	2024/12/2	2024/12/6
シールド	回路設計	友花	2024/10/11	2024/11/25
	回路実装	友花	2024/12/9	2024/12/13
	単体実験	友花	2024/12/20	2025/1/9
総合試験		柚斗	2024/12/6	2025/1/9
ソフト				
Jetson	micro-ROSの開発	介	2024/9/24	2024/10/28
	odomの取得	介	2024/10/28	2024/11/6
	SLAM	介	2024/10/15	2024/11/9
	自律走行	介	2024/11/9	2025/1/8
	格子図面	介	2024/10/27	2025/12/26
	ジャッキ制御	介	2024/11/22	2024/12/16
	WEBアプリ（バックエンド）	祐之	2024/9/24	2024/10/18
	WEBアプリ（フロントエンド）	祐之	2024/9/24	2024/10/18
	全体制御	介	2024/12/2	2024/12/26
ESP32	走行用モーター制御	介	2024/11/5	2024/11/8
	ジャッキ用モーター制御	介	2024/11/22	2024/12/16
	エンコーダー読み取り	介,見介	2024/9/24	2024/10/29
プログラム統合試験		介	2024/12/19	2025/1/10
